

GESTIONNAIRE FACTURES

Application d'archivage et consultation de factures





O2 MAI 2023
CPNV STE-CROIX
Avenue de la gare 14 ;1450 Sainte-Croix



Table des matières

1	Ana	alyse préliminaire	
	1.1	Introduction	. 2
	1.2	Organisation	. 2
	1.3	Méthode de gestion de projet	. 2
	1.4	Objectifs	
	1.5	Planification initiale	. 4
2	Ana	alyse / Conception	. 5
	2.1	Concept	. 5
	2.2	Stratégie de test	
	2.3	Risques techniques	. 6
	2.4	Dossier de conception	. 6
		·	
3	Réa	alisation	
	3.1	Dossier de réalisation	16
	3.2	Description des tests effectués	17
	3.3	Problèmes restants	
	3.4	Liste des documents fournis	21
4	•		~ 4
4		nclusions	
	4.1	Objectifs atteints / non-atteints	
	4.2	Appréciation personnelle	
	4.3	Difficultés rencontrées	
	4.4	Améliorations possibles	21
_	۸		ഹ
5		nexes	
	5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	
	5.2	Glossaire	
	5.3	Sources – Bibliographie	
	5.4	Comparaison planification initiale et finale	
	5.5	Journal de travail	
	5.6	Cahier des charges	
	5.7	Archives du projet	30



1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Dans le cadre de mon TPI, je dois développer une application de bureau en c# qui permettra d'archiver et consulter des factures.


Cette application sera dotée de plusieurs interfaces graphiques implémentées en utilisant des Windows Form.

1.2 Organisation

Rôle	Nom	Adresse email
Chef de projet	Andolfatto Frédérique	frederique.andolfatto@cpnv.ch
Candidat	Künzli Christophe	christophe.kunzli@cpnv.ch
Expert	Malherbe Roger	r.malherbe@rmsoft.ch
Expert	Curchod Aurélie	Aurelie.curchod@eduvaud.ch

1.3 <u>Méthode de gestion de projet</u>

Etant donnée que je travaille seul sur le projet et que la plupart des fonctionnalités du projet sont dépendantes d'autre fonctionnalités, j'ai trouvé que la méthode de travail en cascade était la plus adaptée

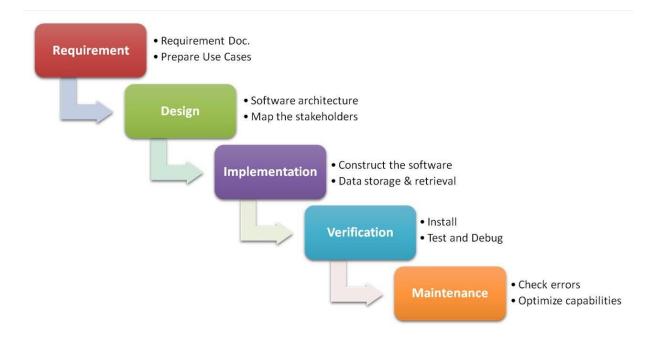



1.4 Objectifs

- Connexion à un compte utilisateur
 - Il y aura 2 types de comptes, les utilisateurs simples et les administrateurs
- Partie administrateur :
 - Importer une facture en entrant manuellement les données de la facture ainsi qu'une image de la facture. Ces données seront stockées dans la base de données afin de pouvoir les consulter.
 - o Ajouter des fournisseurs qui émettent des factures.
- Partie utilisateur :
 - Consulter les factures archivées. Peut rechercher des factures selon certains critères.
 - Après une recherche, une liste des factures correspondants aux critères apparait. Cette liste contient seulement les données les plus importantes.
 - En cliquant sur une des factures, toutes les données de cette facture s'affichent. L'image de la facture apparait aussi.
 - I 'utilisateur peut imprimer l'image
 - o L'utilisateur a accès à des statistiques sur l'ensemble des factures.
 - Montant moyen dépensé par année et par fournisseur sur les 5 dernières années



1.5 Planification initiale

Projet		Planification										
Gestionnaire de factures	Total		02.05.23	09.05.23	16.05.23	23.05.23	30.05.23	06.06.23	13.06.23	20.06.23	27.06.23	
Prévu	90 h 00		18 h 20	23 h 55	16 h 45	23 h 55	7 h 05					
Künzli												
1 Anglyss		SEM	18	19	20	21	22	23	24	25	26	8 h 30
1 Analyse												61130
	11 - Analyse du Cahier des charges	Prévu Künzli	1 h 30									1 h 30
	12 - Planification initiale	Prévu	3 h 00									3 h 00
	13 - Documentation initiale	Künzli Prévu	3 h 00									3 h 00
		Künzli										
	14 - Recherches	Prévu Künzli	1 h 00									1 h 00
	15 -	Prévu Künzli										
	16 -	Prévu										
2 Conceptualisation		Künzli										17 h 50
2 Conceptualisation												17 11 30
	21 - MCD	Prévu Künzli	1 h 30									1 h 30
	22 - MLD	Prévu	2 h 00									2 h 00
	23 - Script création de la base de données	Künzli Prévu	0 h 20								-	0 h 20
		Künzli		51.00								
	24 - Ecrire les scénarios et use cases	Prévu Künzli	3 h 00	5 h 00		ļ	ļ	ļ			ļ	8 h 00
	25 - Dessiner maquette d'interface graphique	Prévu		6 h 00								6 h 00
	26 - Rédiger diagramme de classe	Künzli Prévu										
Künzli				35 h 50								
3 Implémentation												33 11 30
	31 - Implémenter l'authentification à l'application	Prévu Künzli		6 h 25								6 h 25
	32 - (admin) Implémenter l'import manuel des factures	Prévu			7 h 00							7 h 00
	33 - (admin) Implémenter la mise a jour des données fournisseurs	Künzli Prévu			4 h 00						-	4 h 00
		Künzli										
	34 - (user) Implémenter la consultation de facture	Prévu Künzli				7 h 00			\			7 h 00
	35 - (user) Implémenter les statistiques	Prévu Künzli				6 h 25						6 h 25
	36 - Corriger les problèmes restants	Prévu				3 h 00	2 h 00					5 h 00
4 Tests		Künzli							Ш			11 h 00
4 16313												111100
	41 - Ecrire tests unitaire	Prévu		2 h 30	2 h 30	3 h 00						8 h 00
	42 - Test des fonctionnalités implémentées	Künzli Prévu		1 h 00	0 h 30	1 h 00						2 h 30
	43 - Session de test expérience utilisateur	Künzli Prévu				0 h 30						0 h 30
		Künzli										011.00
	44 -	Prévu Künzli		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>		<u></u>	
	45 -	Prévu										
	46 -	Künzli Prévu										
F A desiminate of the contract		Künzli										12 5 50
5 Administratif & autres												13 h 50
	51 - Documentation	Prévu	2 h 30	2 h 30	2 h 30	2 h 30	2 h 00					9 h 30
	52 - Rendu journal de travail + rapport	Künzli Prévu	0 h 30	0 h 30	0 h 15	0 h 30	1 h 05					2 h 20
	53 - Backup base de données	Künzli Prévu							H		+	
		Künzli		 				<u> </u>				
	54 - Finalisation documentation et rendu final	Prévu Künzli		ļ			2 h 00					2 h 00
	55 - Absences	Prévu							 			
	56 - Visite de l'expert	Künzli Prévu						1	H	+	1	
		Künzli										




2 Analyse / Conception


2.1 Concept

2.1.1 Base de données

2.1.1.1 MCD:

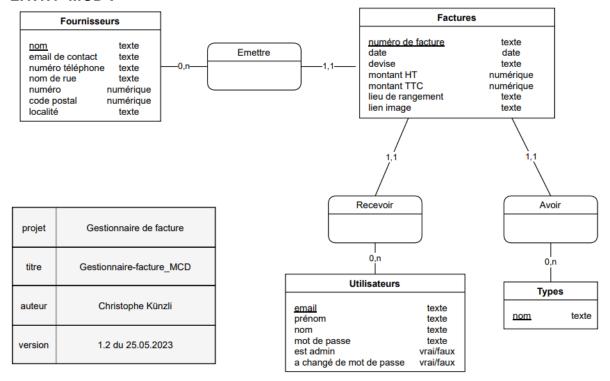

2.1.1.2 MLD:

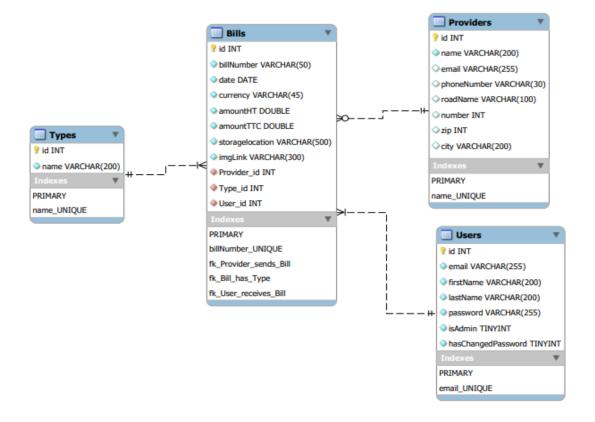



2.2 Stratégie de test

Des classes de test unitaires seront implémentées tout au long du projet afin de tester le bon fonctionnement des feature importantes

Chaque semaine, je vais également tester les fonctionnalités implémentées durant la semaine.

De plus, une session de test de l'application aura lieu vers la fin du projet. Ce test sera effectué par une personne qui ne connait pas l'application, comme un camarade de classe, et servira de test d'expérience utilisateur.

2.3 Risques techniques

Risque	Solution
Manque de connaissance sur	
l'impression de documents	Je me suis renseigné sur internet et j'ai
Manque de connaissance sur la création	créé un projet brouillon afin de me
de graphique dynamique pour afficher	familiariser avec ces éléments
des statistiques	

2.4 Dossier de conception

2.4.1 Hardware

PC en configuration CPNV

2.4.2 Système d'exploitation

L'application sera développée pour Windows 10 et 11.

Il n'y a actuellement aucun plan pour développer des versions de l'application pour d'autre plateformes.

2.4.3 Base de données

Maria DB sera utilisé comme système de gestion de base de données car il offre tout ce qui est nécessaire pour réaliser ce projet, et c'est le SGBD avec lequel j'ai le plus d'expérience car nous l'avons beaucoup utilisé en classe.

2.4.4 Software

Nom	Version	Description
Microsoft Word		Outil de traitement de texte
Excel		Logiciel tableur
Draw.io	13.9.9	Outil de dessin (utilisé pour le MCD)
MySQL	8.0 CE	Outil de gestion et design de base de données
Workbench	0.0 CE	MySQL (utilisé pour le MLD)
Visual Studio	17.5.5	Environnement de développement
Entreprise 2022	17.5.5	Environnement de developpement
Maria DB	10.9	Système de gestion de base de données
Heidi SQL	12.4.0	Interface graphique pour interagir avec Maria DB



2.4.5 NuGet packages

Nom	Version	Usage
BCrypt.Net-Next	4.0.3	Utilisé afin de hacher les mots de passes des utilisateurs et vérifier la correspondance des mots de passes entrés avec les hash stockés dans la base de données
MySqlConnector	2.2.6	Fournit des méthodes permettant de créer une connexion et envoyer des requêtes à une base de données MySQL

2.4.6 Use case : Gestion de factures 2.4.6.1 Scénario 1 : Démarrer l'application

Action	Conditions	Réaction
Je double-clic sur l'exécutable		L'application démarre et le formulaire login apparait

2.4.6.2 Scénario 2 : Login

Action	Conditions	Réaction
J'écris dans le champ « mot de passe »		Le texte s'affiche sous forme d'étoiles « * »
Je clique sur le	Champ Email est vide	Le message d'erreur « Veuillez rentrer une adresses email valide » s'affiche
« connexion »	Champ mot de passe est vide	Le message d'erreur « Veuillez rentrer votre mot de passe » s'affiche
	Email ou mot de passe erroné	Le message d'erreur « Email ou mot de passe erroné » s'affiche
Je clique sur le bouton « connexion » après avoir rempli mon email et mon	Email et mot de passe correctes Mon compte utilisateur n'a pas les droits d'administrateur	Le formulaire login se ferme et le formulaire principal permettant de consulter les factures et afficher les statistiques apparait
mot de passe	Email et mot de passe correctes Mon compte utilisateur a les droits d'administrateur	Le formulaire login se ferme et le formulaire de choix d'action s'ouvre
Je clique sur le bouton « connexion »	Je me connecte pour la première fois avec ce compte utilisateur	Le formulaire de changement de mot passe apparait



2.4.6.3 Scénario 2.1 : Changer de mot de passe

Action	Conditions	Réaction
J'écris du texte dans le champ « nouveau mot de passe » ou dans le champ « Confirmer nouveau mot de passe »		Le texte s'affiche sous forme d'étoiles « * »
	Le champ « nouveau mot de passe » est vide	Le message d'erreur « Veuillez rentrer un mot de passe » s'affiche
	Le champ « confirmer nouveau mot de passe » est vide ou le texte rentré ne correspond pas au mot de passe rentré dans le champ « Nouveau mot de passe »	Le message d'erreur « Veuillez confirmer votre mot de passe » s'affiche
Je clique sur le bouton	La longueur du mot de passe est plus petite que 8 caractères	Le message d'erreur « Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères » s'affiche
« Confirmer »	Le mot de passe ne contient pas de caractères spéciaux ou ne contient pas de chiffres ou ne contient pas de lettres	Le message d'erreur « Le mot de passe doit contenir au moins une lettre, un chiffre, et un caractère spécial »
	Le mot de passe est valide	Le mot de passe de l'utilisateur change dans la DB. Ce formulaire se ferme et formulaire suivant s'ouvre. Le choix du formulaire qui s'ouvre dépendra du type d'utilisateur (admin ou pas)



2.4.6.4 Scénario 3 : Choisir action

Action	Conditions	Réaction
Je clique sur le bouton « Importer une facture »		Le formulaire d'importation de facture s'ouvre
Je clique sur le bouton « Ajouter fournisseur »		Le formulaire d'ajout de fournisseur s'ouvre
Je clique sur le bouton « Consulter vos factures »		Le formulaire principal permettant de consulter les factures et afficher les statistiques apparait
Je clique sur le bouton « Statistiques générales »		Le formulaire permettant de voir des statistiques basées sur l'entièreté des factures dans la base de données apparait
Je clique sur le bouton « Créer nouvel utilisateur »		Le formulaire permettant de créer un nouveau compte utilisateur pour se connecter à l'application apparait
Je clique sur le bouton « Quitter »		L'application se ferme

2.4.6.5 Scénario 4 Importer une facture

Action	Conditions	Réaction
Je clique sur le bouton « Image »		Une boite de dialogue me permettant de parcourir le système de fichiers et sélectionner un fichier apparait
Je sélectionne un fichier depuis le dialogue	Le fichier sélectionné n'est pas de type PDF	Le message d'erreur « Veuillez sélectionner un fichier de type PDF » s'affiche, et le fichier n'est pas sauvegardé
Je clique sur le bouton « Importer	Un ou plusieurs des champs obligatoires sont vides. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile « * »	Le message d'erreur « Veuillez remplir tous les champs obligatoires » apparait
facture »	Tous les champs obligatoires sont remplis et un fichier PDF a été sélectionné	La facture est stockée dans la DB, avec un lien vers une copie de l'image de la facture
Je clique sur le bouton « Annuler »		Ce formulaire se ferme, et le formulaire de choix d'action se rouvre



2.4.6.6 Scénario 5 Ajouter un fournisseur

Action	Conditions	Réaction	
Je clique sur le			
bouton « Ajouter fournisseur »	Tous les champs obligatoires sont remplis	Le fournisseur est ajouté à la DB. Ce formulaire se ferme, et le formulaire de choix d'action se rouvre	
Je clique sur le bouton « Annuler »		Ce formulaire se ferme, et le formulaire de choix d'action se rouvre	

2.4.6.7 Scénario 6 : Consulter mes factures

Zi-ion occination decidates inconstances			
Action	Conditions	Réaction	
J'arrive sur le formulaire de consultation de factures		Toutes les factures attribuées à mon utilisateur apparaissent sous forme de liste	
Je clique sur une facture dans la liste		Toutes les données de la facture, y compris son image, apparaissent dans un nouveau formulaire	
Je clique sur le bouton « Quitter »	Mon compte est un compte administrateur	Ce formulaire se ferme, et le formulaire de choix d'action se rouvre	
	Mon compte n'est pas un compte administrateur	L'application se ferme	

Scénario 6.1 : Consulter une facture

Occidend 6.1. Consuler drie factore			
Action	Conditions	Réaction	
J'arrive sur le formulaire de consultation de la facture		Toutes les informations de la facture s'affichent	
Je clique sur le bouton « imprimer facture »		L'image de la facture s'imprime sur mon imprimante par défaut	
Je clique sur le bouton « Afficher l'image »		L'image de la facture apparait	
Je clique sur le bouton « Fermer »		Ce formulaire se ferme	



2.4.6.8 Scénario 6.2 : Rechercher des factures

Action	Conditions	Réaction
	Aucun critère de recherche n'est rempli	Toutes les factures attribuées à mon utilisateur apparaissent
	Le critère de recherche par « fournisseur » est rempli	Seules les factures émises par le fournisseur choisi apparaissent
Je clique sur le bouton « Recherche »	Le critère de recherche par « montant TTC » est rempli	Seules les factures dont le montant est compris entre les valeurs min et max demandées apparaissent
	Les critères de recherche par « fournisseur » et « montant TTC » sont remplis	Seules les factures émises par le fournisseur choisi et dont le montant est compris entre les valeurs min et max demandées apparaissent

2.4.6.9 Scénario 6.3 : Consulter mes statistiques

Action	Conditions	Réaction
J'arrive sur le formulaire de consultation de factures		Aucune statistique n'est affichée
Je sélectionne un fournisseur		Les statistiques concernant les factures des 5 dernières années provenant du fournisseur sélectionné s'affichent - Montant TTC total dépensé par année - Moyenne des montants TTC par année


2.4.6.10 Scénario 7 : Créer un nouvel utilisateur

Action	Conditions	Réaction
	Un ou plusieurs des champs textes ne sont pas remplis	Le message d'erreur « Veuillez renseigner tous les champs » s'affiche
	Tous les champs sont remplis	Le message d'erreur « Cet utilisateur existe déjà » apparait
Je clique sur le bouton « Créer	Il existe déjà un utilisateur utilisant la même adresse mail	
utilisateur »	Tous les champs sont remplis	Le nouvel utilisateur est ajouté à la base de données avec un mot de passe par défaut
		Ce formulaire se ferme et le formulaire de choix d'action se rouvre




2.4.7 Maquettes

Formulaires de login et changement de mot passe




Nous avons détecté que vous connecté pour la première fois, veuillez changer de mot de passe . - Au moins 8 caractères - Doit contenir des lettres et des chiffres - Au moins 1 caractère spécial (# \$% & () * + - <=>? @)		
Nouveau mot de passe		
Confirmer nouveau mot d	le passe	
С	onfirmer	

Menu de choix pour administrateurs






Formulaire d'importation de facture





Formulaire pour ajouter un fournisseur






Formulaire de consultation des factures et statistiques

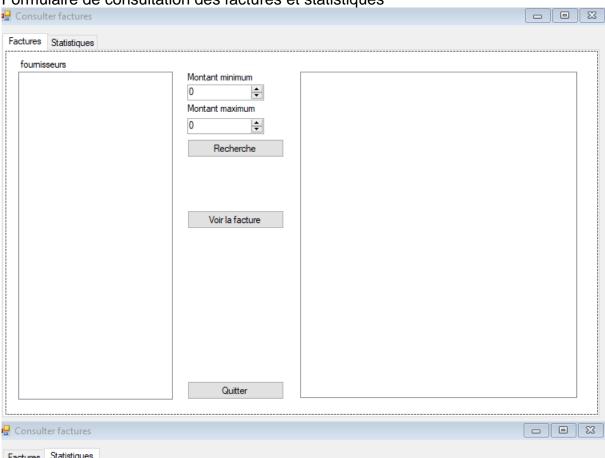

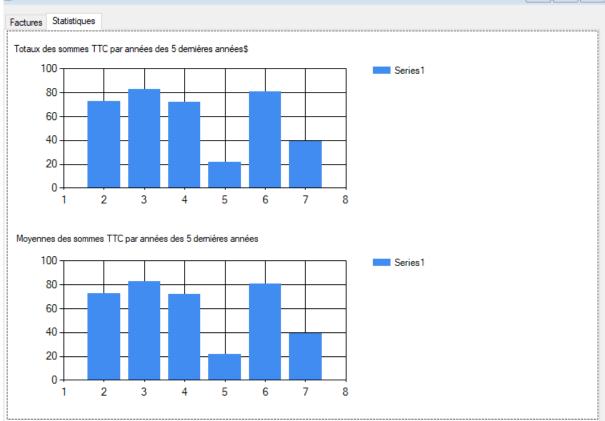




Formulaire création d'un nouveau compte utilisateur



2.4.8 Diagramme de classe

La classe « Bill » représente les factures qui sont au centre de ce projet. Chaque facture est émise par un fournisseur représenté par la classe « Provider », un type de facture, et un utilisateur à qui la facture est adressée.

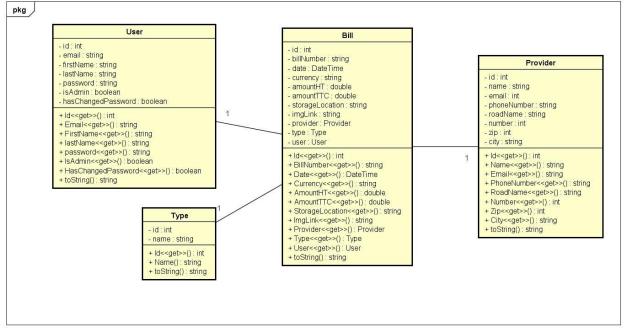

powered by Astah



3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

3.1.1 Répertoire

Le code source du projet sur trouve sur le repository distant : https://github.com/ChristopheKunzli/Gestionnaire-factures

3.1.2 Fichiers c#

Nom	Description	
Program.cs	Point de départ de l'application et gère le passage du	
1 Togram.co	formulaire de login au reste de l'application	
ConnectionDB.cs	Classe gérant la liaison entre l'application et la base de	
Connection DB.cs	données	
Login.cs		
ChangePassword.cs		
ChooseAction.cs		
AddProvider.cs	Classes contenant les Windows Form servant d'interfaces graphiques	
AddUser.cs		
ImportBill.cs		
ConsultBills.cs		
ViewBill.cs		
User.cs		
Bill.cs	Classes contenant les définitions des différents objets	
Provider.cs	intervenant dans l'application	
Type.cs		

3.1.3 Fichiers bases de données

Nom	Description
db_create.sql	Script de création de la base de données
Gestionnaire-factures_MCD	MCD de la DB
Gestionnaire-factures_MLD	MLD de la DB
backup.sql	Script contenant un backup de la DB
db_test.sql	Script permettant de créer la base de données de test

16



3.2 Description des tests effectués

En plus des tests unitaires, des sessions de test ont été prévues pour tester chaque fonctionnalité implémentée.

3.2.1 Tests de fonctionnalité

Tous ces tests sont effectués par Christophe Künzli, dans la salle SC-C236, sur les postes disponibles dans cette salle.

Date	Poste	Objectifs	Problèmes
10.05.2023	SC-C236-PC09	Tester la fonctionnalité de connexion à l'application et le changement de mot de passe	Aucun problème trouvé
15.05.2023	SC-C236-PC09	Tester l'ajout de fournisseurs	Aucun problème trouvé
15.05.2023	SC-C236-PC09	Tester la création de comptes utilisateurs	Aucun problème trouvé
16.05.2023	SC-C236-PC09	Tester l'import de factures et la copie des fichiers PDF	Aucun problème trouvé
23.05.2023	SC-C236-PC09	Tester la recherche de facture	Aucun problème trouvé
23.05.2023	SC-C236-PC09	Tester l'affichage des statistiques	Le calcul des moyennes est erroné On ne peut pas réafficher le graphique avec toutes les factures

3.2.2 Classes de tests unitaire

Des classes de tests unitaires ont été écrites dans un projet à part. Ce projet utilise le Framework NUnit afin d'effectuer ces tests.

Classe	Description
UserTests.cs	Tester la classe User
ConnectionDBTests.cs	Tester la classe de connexion à la base de données (ConnectionDB.cs) Afin d'éviter des conflits avec la base de données utilisées par l'application, cette classe de test utilise une autre base de données crée via un script de backup



3.2.3 Tests d'expérience utilisateur

3.2.3.1 Objectifs du test

- Tester la connexion à la base de données depuis un poste distant
- Voir si un utilisateur qui découvre l'application est capable de l'utiliser

3.2.3.2 Marche à suivre du test

- 1. Créer au préalable un compte pour le testeur
 - a. Ce compte doit avoir les privilèges administrateur
- 2. Expliquer au testeur qu'il a accès à un compte à son nom avec un mot de passe par défaut
 - a. Le mot de passe par défaut est « 1234 »
- 3. Importer le code du projet sur le poste utilisé lors du test
 - a. Cette étape peut être ignorée si le poste « SC-C236-PC09 » est utilisé
- 4. L'utilisateur se connecte avec son compte
- 5. L"utilisateur ajoute un fournisseur
- 6. L'utilisateur importe 2 factures (fichier fourni au préalable)
- 7. L'utilisateur consulte ses factures
 - a. Il ouvre le fichier PDF d'une des 2 factures
 - b. Il imprime le fichier PDF d'une des 2 factures
- 8. L'utilisateur consulte les statistiques de ses factures
 - a. L'utilisateur change de fournisseur
- 9. Quitter puis relancer l'application
- Connecter l'utilisateur à un compte ayant déjà plusieurs factures de plusieurs fournisseurs différents
 - a. Le compte « christophe.kunzli@cpnv.ch »
- 11. L'utilisateur effectue une recherche des factures par fournisseur et par montant

3.2.3.3 Réalisation du test

Date: 23.05.2023

Testeur: Corentin Bardet **Poste**: SC-C236-PC09

Problèmes relevés :

- L'utilisateur a voulu ouvrir une facture en double cliquant sur la ligne de la facture mais n'a pas pu
- L'heure s'affiche alors que l'utilisateur n'a entré que la date de la facture
- Les moyennes affichées dans le graphique sont fausses
- Aucun message d'erreur n'apparait si le montant minimum est plus grand que le montant maximum
- L'utilisateur a voulu chercher seulement les factures au-dessus d'un certain montant mais n'a pas pu



3.3 Problèmes restants

Problème	Conséquence	Solution possible	Corrigé
Cliquer sur le bouton « Voir la facture » dans le formulaire de consultation de facture lorsqu'aucune facture n'est sélectionnée cause un crash de l'application	Mauvaise expérience utilisateur	Ajouter une sécurité afin de vérifier qu'une facture a bien été sélectionnée avant d'ouvrir un nouveau formulaire	
Le formulaire d'affichage d'une facture montre l'heure de la facture alors que seul l'information de la date a été rentré	Information inutile s'affiche et peut perturber l'utilisateur	Modifier la méthode d'affichage de la date	
Dans les statistiques, le calcul des moyennes des montants des facture est faux	Information fausse montrée à l'utilisateur	Corriger le calcul de la moyenne	
Lors d'une recherche des factures par montant, il est obligatoire de fournir un montant minimum et un montant maximum	L'utilisateur peut être frustré de ne pas pouvoir effectuer une recherche comme il/elle le veut	Autoriser la recherche seulement par montant minimum et la recherche seulement par montant maximum	X
Il est impossible d'ouvrir une facture en cliquant dessus dans le tableau des factures	Mauvaise expérience utilisateur	Ajouter un événement afin de détecter les cliques ou doubles cliques sur le tableau des factures, puis ouvrir la bonne facture	



Dans l'affichage de la liste des factures, les titres des colonnes du tableau sont écrits en Anglais	Un utilisateur ne connaissant pas l'anglais pourrait ne pas pouvoir lire les données	Modifier l'affichage du tableau pour écrire les titres en français	
Dans la listbox permettant de sélectionner un fournisseur afin d'effectuer une recherche, si le nom d'un fournisseur est trop long le nom ne s'affiche pas complètement	Données illisible	 Raccourcir le nom Autoriser l'affichage sur plusieurs lignes Agrandir l'espace de la listbox en largeur 	
L'application n'est pas capable d'afficher les fichiers PDF des factures ni de les imprimer. A la place, ces PDF sont ouverts dans l'application par défaut du client		Trouver une extension de gestion de fichier PDF gratuite et fonctionnelle	X
Consulter les factures avec un utilisateur qui n'a pas de facture cause un crash	Mauvaise expérience utilisateur	Trouver la source du crash et la corriger	
Dans les statistiques, il est impossible de reset les graphiques à l'état d'affichage de toutes les factures		Ajouter un bouton reset ou une option « tous les fournisseurs » dans la combobox	



3.4 Liste des documents fournis

- Rapport complet
- Archive contenant le script de création de la DB et l'exécutable de l'application

4 Conclusions

4.1 Objectifs atteints / non-atteints

Toutes les fonctionnalités demandées ont été implémentées. Cependant, Il y eu quelques difficultés avec la gestion de fichiers PDF.

4.2 Appréciation personnelle

Dans son ensemble, ce projet s'est plutôt bien passé. J'ai cependant eu quelques accroches, notamment lorsque je design des interfaces graphiques qui ne sont parfois pas très intuitive à utiliser ni esthétiques.

4.3 <u>Difficultés rencontrées</u>

- La génération de graphiques a causé quelques difficultés et m'a pris pas mal de temps
- Il a été difficile d'estimer le temps nécessaire pour certaines tâches
- La gestion des PDF à l'intérieur d'une application c# (affichage et impression) n'a pas été possible. À la place, les fichiers PDF sont ouverts en utilisant l'application par défaut du poste client, ce qui permet de les lire et de les imprimer.
- L'interface de recherche des factures qui a été implémentée n'est pas intuitive à utiliser.

4.4 Améliorations possibles

- Corriger les problèmes restants
- Migrer la base de données vers un vrai serveur appartenant à l'entreprise/école
- Stocker les PDF sur un serveur.
- Connecter l'application avec l'AD de l'entreprise/école afin que les utilisateurs puissent se connecter avec leur profil, ou les connecter automatiquement à l'application en utilisant leur profil
- Permettre la génération automatique de fichiers PDF en se basant sur les informations stockées dans la base de données
- Utiliser une bibliothèque permettant la gestion de fichiers PDF
 - o Imprimer les PDF depuis l'application
 - o Afficher les PDF dans l'application



5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

Pour ce TPI, je dois développer une application CRUD permettant d'archiver des factures dans une base de données afin de pouvoir les consulter plus tard sans avoir besoin de retrouver la facture papier. L'application doit permettre aussi à chaque utilisateur d'effectuer des recherches de factures par montant et/ou par fournisseur. Elle doit aussi être capable d'afficher des statistiques concernant les factures d'un utilisateur. Les utilisateurs possédant les droits administrateurs peuvent aussi insérer des nouveaux fournisseurs.

Durant la réalisation j'ai dû retravailler un peu la base de données car il y avait certains problèmes avec la conception initiale. Particulièrement, pour la table des utilisateurs à laquelle j'ai rajouté un champ booléen indiquant si l'utilisateur a déjà changé de mot de passe ou pas. J'ai aussi dû changer les types des champs contenants les montants des factures de INT à DOUBLE afin de pouvoir entrer des données plus réalistes.

Enfin, toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement à l'exception de la gestion des fichiers PDF que j'ai choisi de gérer de manière simplifiée, c'est-à-dire, l'application permet seulement d'ouvrir les fichiers PDF des factures en utilisant l'application par défaut de l'utilisateur pour lire et imprimer les PDF. Le test utilisateur a été concluant, le testeur a trouvé que l'application est assez facile à utiliser, à l'exception de la recherche de facture qui lui a posé quelques difficultés.

5.2 Glossaire

Termes	Définitions				
Active directory / AD	Service d'annuaire développé par Microsoft pour les				
Active directory / AD	réseaux Windows				
Base de données / DB	Ensemble d'informations qui est organisé de manière à				
base de données / DB	être facilement accessible, géré et mis à jour				
C#	Langage de programmation				
	Acronyme désignant les quatre opérations de base à				
CRUD	effectuer sur une base de données : Create (créer), Read				
	(lire), Update (mettre à jour), Delete (Supprimer)				
DOUBLE	Type de données : Nombre réel				
Framework	Ensemble d'outils et de composants logiciels organisés				
Framework	conformément à des patterns				
Hachage / hacher	Transformation d'une chaine de caractères en valeur ou				
riacriage / riacriei	en clé de longueur fixe				
INT	Type de données : Nombre entier				
MySQL	Serveur de base de données relationnelle				
SGDB	Système de gestion de base de données				
SQL	Langage de requêtes sur base de données relationnelle				



5.3 Sources - Bibliographie

- https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/uml-aggregation-vs-composition/
- https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.datavisualization.charting.chart?view=net framework-4.8.1&viewFallbackFrom=netframework-6
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt
- https://stackoverflow.com/questions/13677318/how-to-run-multiple-sql-commands-in-a-single-sql-connection
- https://stackoverflow.com/questions/54878407/cannot-filter-pdfs-and-txt-files-in-openfiledialog
- https://stackoverflow.com/questions/9092160/check-if-a-folder-exist-in-a-directory-and-create-them-using-c-sharp
- https://stackoverflow.com/questions/2220134/displaying-a-pdf-file-from-winform
- https://stackoverflow.com/questions/15040872/adding-enum-values-to-a-simple-combobox
- https://stackoverflow.com/guestions/9807414/dao-unit-testing
- https://stackoverflow.com/questions/1449646/how-can-i-execute-a-sql-from-c
- https://stackoverflow.com/questions/3309188/how-to-sort-a-listt-by-a-property-in-the-object
- https://stackoverflow.com/guestions/34277545/bind-a-list-of-objects-to-chart
- https://stackoverflow.com/questions/737151/how-to-get-the-list-of-properties-of-a-class



5.4 Comparaison planification initiale et finale

Projet		Planification										
Gestionnaire de factures	Total		02.05.23	09.05.23	16.05.23	23.05.23	30.05.23	06.06.23	13.06.23	20.06.23	27.06.23	
Prévu	90 h 00		18 h 20	23 h 55	16 h 45	23 h 55	7 h 05					
Künzli	90 h 00	6514	18 h 20	23 h 55 19	16 h 45 20	23 h 55	7 h 05 22	23	04	25	0/	l
1 Analyse		SEM	18	19	20	21	22	23	24	25	26	8 h 30 11 h 10
	11 - Analyse du Cahier des charges	Prévu	1 h 30								T	1 h 30
	12 - Planification initiale	Künzli Prévu	1 h 30 3 h 00									1 h 30 3 h 00
	13 - Documentation initiale	Künzli Prévu	3 h 00 3 h 00									3 h 00 3 h 00
	14 - Recherches	Künzli Prévu	2 h 40 1 h 00									2 h 40 1 h 00
	15 -	Künzli Prévu	1 h 00	2 h 00	1 h 00							4 h 00
	16 -	Künzli Prévu										
2 Concontualisation	<u> </u>	Künzli										17 h 50
2 Conceptualisation												17 h 25
	21 - MCD	Prévu Künzli	1 h 30 1 h 40	0 h 05		-						1 h 30 1 h 45
	22 - MLD	Prévu Künzli	2 h 00 1 h 25	0 h 05								2 h 00 1 h 30
	23 - Script création de la base de données	Prévu	0 h 20									0 h 20
	24 - Ecrire les scénarios et use cases	Künzli Prévu	0 h 05 3 h 00	0 h 05 5 h 00								0 h 10 8 h 00
	25 - Dessiner maquette d'interface graphique	Künzli Prévu	3 h 50	4 h 10 6 h 00								8 h 00 6 h 00
	26 - Rédiger diagramme de classe	Künzli Prévu		4 h 00								4 h 00
3 Implémentation		Künzli		2 h 00								2 h 00 35 h 50
	Total transfer and a March transfer after a Name Paragraph	D-1		/ h 05			1 1					26 h 20 6 h 25
	31 - Implémenter l'authentification à l'application	Prévu Künzli		6 h 25 3 h 00	1 h 00							4 h 00
	32 - (admin) Implémenter l'import manuel des factures	Prévu Künzli			7 h 00 6 h 00							7 h 00 6 h 00
	33 - (admin) Implémenter la mise a jour des données fournisseurs	Künzli			4 h 00 0 h 45							4 h 00 0 h 45
	34 - (user) Implémenter la consultation de facture	Prévu Künzli				7 h 00 5 h 35						7 h 00 5 h 35
	35 - (user) Implémenter les statistiques	Prévu Künzli				6 h 25 4 h 00						6 h 25 4 h 00
	36 - Corriger les problèmes restants	Prévu Künzli		***************************************		3 h 00 6 h 00	2 h 00					5 h 00 6 h 00
4 Tests												11 h 00
	41 - Ecrire tests unitaire	Prévu	L	2 h 30	2 h 30	3 h 00		L	[]			4 h 55 8 h 00
	42 - Test des fonctionnalités implémentées	Künzli Prévu		0 h 30 1 h 00	2 h 00 0 h 30	1 h 00						2 h 30 2 h 30
	43 - Session de test expérience utilisateur	Künzli Prévu		0 h 30	0 h 55	0 h 30 0 h 30						1 h 55 0 h 30
	44 -	Künzli Prévu				0 h 30						0 h 30
	45 -	Künzli Prévu										
	46 -	Künzli Prévu										
	190	Künzli					<u> </u>	<u> </u>				
5 Administratif & autres												13 h 50 30 h 10
	51 - Documentation	Prévu Künzli	2 h 30 2 h 40	2 h 30 4 h 00	2 h 30 4 h 10	2 h 30 7 h 00	2 h 00 4 h 00					9 h 30 21 h 50
	52 - Rendu journal de travail + rapport	Prévu Künzli	0 h 30 0 h 30	0 h 30 0 h 20	0 h 15 0 h 25	0 h 30 0 h 20	1 h 05					2 h 20 1 h 35
	53 - Backup base de données	Prévu Künzli										
	54 - Finalisation documentation et rendu final	Prévu					2 h 00	 		-		2 h 00
	55 - Absences	Künzli Prévu		21.00	-		3 h 05	 			1	3 h 05
	56 - Visite de l'expert	Künzli Prévu		3 h 10								3 h 10
		Künzli			0 h 30				Ш			0 h 30



5.5 Journal de travail

Nom		Künzli Christophe		Aujourd'hui		
Journal				7 tajouru mur		
Date	Sem	Activité	Heures	Remarques		
02.05.2023	18	11 - Analyse du Cahier des charges	1:30	Après avoir reçu le cahier des charges de la part de		
				l'expert, j'ai passé une trentaine de minutes à le relire.		
				J'ai quelques questions à poser à la cheffe de projet.		
02.05.2023	18	12 - Planification initiale	3:00	J'ai utilisé le reste de la matinée et un peu de temps		
				l'après- midi pour rédiger le planning initial		
02.05.2023	18	13 - Documentation initiale	2:40	J'ai récupéré un chablon du rapport dont j'ai commencé		
				à remplir l'introduction, les objectifs etc		
03.05.2023	18	21 - MCD	1:10	Il y a quelques problèmes avec le MCD. Notamment pa		
				rapport à l'entité des utilisateurs de l'application qui		
				n'est pas reliée au reste des entités. Je vais poser		
				quelques questions au chef de projet puis corriger mor		
				MCD		
03.05.2023	18	22 - MLD	1:15			
03.05.2023	18	21 - MCD	0:10	Mme Andolfatto est passée me voir tout de suite pour		
				répondre à mes questions. Après discussion avec elle		
				j'ai pu corriger le MCD		
03.05.2023	18	14 - Recherches	1:00	J'ai créé un projet brouillon pour tester certains points		
				pas évidents (Upload de fichiers, afficher image,		
				imprimer image, etc)		
03.05.2023	18	23 - Script création de la base de données	0:05	Généré à partir du MLD via MySQL Workbench		
04.05.2023	18	21 - MCD	0:20	J'ai pris un peu de temps pour corriger quelques petits		
				problèmes avec le MCD		
04.05.2023	18	22 - MLD	0:10	Mis à jour pour correspondre au nouveau MCD		
04.05.2023	18	24 - Ecrire les scénarios et use cases	3:50	Pas encore terminé, je les finirais lundi prochain		
04.05.2023	18	51 - Documentation	2:40	Mise à jour de la documentation		
04.05.2023	18	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:30			
08.05.2023	19	21 - MCD	0:05	J'ai rajouté un champ pour indique si l'utilisateur a déjà		
00/03/2023			0.03	changé de mot de passe		
08.05.2023	19	22 - MLD	0:05	Mise à jour du MLD pour inclure le changement du MCD		
00/03/2020			0.03	This cape and the pour mount is an angement and most		
08.05.2023	19	23 - Script création de la base de données	0:05	Mise à jour du script pour inclure le changement		
08.05.2023	19	24 - Ecrire les scénarios et use cases	2:10	inise a jeur du sampe peur maure le anangement		
08.05.2023	19	55 - Absences	3:10	Absence pour cause de maladie		
09.05.2023	19	24 - Ecrire les scénarios et use cases	2:00	Terminé		
09.05.2023	19	25 - Dessiner maquette d'interface graphique	2:00	Il manque encore la maquette du formulaire affichant		
09.03.2023	19	23 - Dessiner maquette u interface grapmque	2.00	les factures et les statistiques		
09.05.2023	19	25 - Dessiner maquette d'interface graphique	2:00	Fini les maquettes		
09.05.2023	19	51 - Documentation	1:00	Ajouter le travail effectué en début de semaine au		
09.03.2023	19	31 - Documentation	1.00	rapport avant le rendu		
09.05.2023	19	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:10	Tapport avant le rendu		
10.05.2023	19	31 - Implémenter l'authentification à l'application	2:00	L'implémentation du login a duré beaucoup moins		
10.03.2023	19	31 - Implementer i authentification a rapplication	2.00			
10.05.2023	19	42 - Test des fonctionnalités implémentées	0:30	Iongtemps que prévu Test des fonctionnalités de login et de changements		
10.05.2025	19	42 - Test des fonctionnantes implementees	0.30	3		
10.0F 2022	10	41 Ferira tests unitaire	0.20	mot passe lors de la 1ère connexion J'ai rédigé des tests unitaires sur la classe User		
10.05.2023	19	41 - Ecrire tests unitaire	0:30	5		
40.05.0000	40		4.00	J'ai rajouté le menu de sélection pour les utilisateurs		
10.05.2023	19	31 - Implémenter l'authentification à l'application	1:00	qui possède les droits administrateur		
11.05.2023	19	26 - Rédiger diagramme de classe	2:00	land to account a set of the set		
44.05				Je suis repassé sur toute ma documentation pour		
11.05.2023	19	51 - Documentation	1:00	trouver et corriger des éventuels erreurs		
				J'ai cherché sur internet comment imprimer des fichier		
11.05.2023	19	14 - Recherches	1:00	pdf.		
11.05.2023	19	14 - Recherches	1:00	Continuation des recherches du matin		
11.05.2023	19	51 - Documentation	2:00	Préparation de la documentation avant rendu		
11.05.2023	19	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:10			



				Cotto fonctionnalité m'a pris hoqueous maiss de temps
				Cette fonctionnalité m'a pris beaucoup moins de temps
		22 (-4-1-1-1)		que prévu. Je vais tester le bon fonctionnement, puis je
45.05.0000	20	33 - (admin) Implémenter la mise a jour des données	0.45	peux prendre de l'avance et commencer à implémenter
15.05.2023	20	fournisseurs	0:45	la prochaine fonctionnalité tout de suite.
				J'ai quelques fournisseurs via le formulaire, je n'ai pas
15.05.2023	20	42 - Test des fonctionnalités implémentées	0:15	rencontré de bug
15.05.2023	20	51 - Documentation	1:25	Mise à jour de la documentation
				Comme j'ai eu de l'avance ce matin, j'ai pris du temps
45.05.0000	20		4.00	pour implémenter un formulaire permettant de créer
15.05.2023	20	31 - Implémenter l'authentification à l'application	1:00	des nouveaux comptes utilisateur
				J'ai testé la création de nouveaux utilisateurs, aucun bug
15.05.2023	20	42 - Test des fonctionnalités implémentées	0:10	rencontré
45.05.000	20		2.00	Pas encore terminé, je finirai cette fonctionnalité
15.05.2023	20	32 - (admin) Implémenter l'import manuel des factures	2:00	demain
16.05.2023	20	56 - Visite de l'expert	0:30	\$1 II
				À la suite d'une discussion Mme Andolfatto, nous avons
				décidé d'apposer au nom du fournisseur le type de
				service. Ce choix permet de justifier la présence de
				plusieurs entrées du même fournisseur avec des
16.05.2023	20	32 - (admin) Implémenter l'import manuel des factures	3:30	adresses différentes
46.05.000	20		0.00	J'ai ajouté la création automatique des dossiers de
16.05.2023	20	32 - (admin) Implémenter l'import manuel des factures	0:30	stockage des fichiers pdf contenant les factures
16.05.2023	20	42 - Test des fonctionnalités implémentées	0:30	J'ai pu importer des factures de fournisseurs différents
16.05.2023	20	51 - Documentation	2:00	Préparation de la documentation avant rendu
16.05.2023	20	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:10	
				J'ai pris du temps pour rechercher des solutions pour le
47.05.2022	20	44 Parkershar	4.00	traitement de pdf dans une application c# (affichage et
17.05.2023	20	14 - Recherches	1:00	impression)
47.05.0000	20		2.00	J'ai commencé à écrire une classe afin de tester la classe
17.05.2023	20	41 - Ecrire tests unitaire	2:00	de connexion à la base de données
17.05.2023	20	51 - Documentation	0:45	Préparation de la documentation avant rendu
				Comme cette semaine est raccourcie, j'envoie le 2ème
				rendu aujourd'hui. Le contenu du rapport n'a pas
				beaucoup changé vu qu'il n'y a eu que très peu de temps
17.05.2023	20	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:15	pour travailler depuis le rendu d'hier
22.05.2023	21	34 - (user) Implémenter la consultation de facture	2:25	Création du formulaire listant les factures
22.05.2022	24	24 / Alexalder and the control for the first of	2.40	Faire des recherches parmi la liste de facture et afficher
22.05.2023	21	34 - (user) Implémenter la consultation de facture	3:10	toutes les données d'une facture
23.05.2023	21	36 - Corriger les problèmes restants	1:00	J'ai corrigé quelques bugs avec la recherche de facture
22.05.2022	24	25 ()	2.00	L'affichage des statistiques fonctionne, mais il est
23.05.2023	21	35 - (user) Implémenter les statistiques	3:00	encore impossible de filtrer par founisseur
22.05.2022	24	25 /) [] /	4.00	J'ai implémenté le filtrage par fournisseurs des données
23.05.2023	21	35 - (user) Implémenter les statistiques	1:00	utilisées dans la charte J'ai testé la recherche de facture et l'affichage des
22.05.2022	24	42. Took doe for stier welik foi week for	0.20	_
23.05.2023	21	42 - Test des fonctionnalités implémentées	0:30	statistiques par fournisseurs
22.05.2022	24	42. Cassian da tast sun frianca utilizata un	0.20	Test d'expérience utilisateur par Corentin Bardet.
23.05.2023	21 21	43 - Session de test expérience utilisateur 51 - Documentation	0:30 1:00	Quelques problèmes ont été relevés
23.05.2023				Préparation de la documentation avant rendu
23.05.2023	21	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:10	l'ai pricup pou de temps pour corriers se deise de
				J'ai pris un peu de temps pour corriger certains des
				problèmes relevés par corentin lors du test
				d'expérience utilisateur. Je suis aussi repassé sur tout le
24 05 2022	24	26 Corrigor los nachibarras aratesta	2,00	code pour ajouter des commentaires et entêtes de
24.05.2023	21	36 - Corriger les problèmes restants	2:00	fonctions En plus d'avancer la documentation
24.05.2023	21	51 - Documentation	2:00	,
25.05.2023	21	36 - Corriger les problèmes restants	1:00	J'ai corrigé plusieurs des problèmes restants
25 05 2022	24	F1 Doggeroateties	2,00	En plus d'avancer la documentation, j'ai remis à jour les
25.05.2023	21	51 - Documentation	3:00	MCD et MLD
25.05.2023	21	36 - Corriger les problèmes restants	2:00	J'ai corrigé plusieurs des problèmes restants
25.05.2023	21	51 - Documentation	1:00	Préparation de la documentation avant rendu
25.05.2023	21	52 - Rendu journal de travail + rapport	0:10	
30.05.2023	22	51 - Documentation	4:00	A control of the cont
				A cause de certains problèmes, le rendu final officiel a
				été repoussé à demain. Mais comme je n'ai pas besoin
20.05.2222	22	Ed Simultantian des constatts at 1 C c	2.05	de ce temps supplémentaire, je fais mon rendu final
30.05.2023	22	54 - Finalisation documentation et rendu final	3:05	aujourd'hui



5.6 Cahier des charges

5.6.1 Informations générales

On Plan	Nom : KUNZLI	Prénom : CHRISTOPHE				
Candidat :	☐ : christophe.kunzli@cpnv.ch	2 : 079 174 62 65				
Lieu de travail :	⊠ CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix					
Orientation :	 □ 88601 Développement d'application ⋈ 88602 Informatique d'entreprise □ 88603 Technique des systèmes 					
Oh of do musication	Nom : ANDOLFATTO	Prénom : Frédérique				
Chef de projet :	☐ : frederique.andolfatto@cpnv.ch	2 : 077 206 66 45				
	Nom : Malherbe	Prénom : Roger				
Expert 1 :	: r.malherbe@rmsoft.ch	2 : 079 230 72 37				
	Nom : Curchod	Prénom : Aurélie				
Expert 2 :	☐ : aurelie.curchod@eduvaud.ch	2 : 021 338 22 40				
Période de réalisation	Du mardi 2 mai 2023 à 8h00 au mard	i 30 mai 2023 à 16h50				
Horaire de travail :	Lundi 09h50-12h15 13h30-16h55 Mardi 08h00-12h15 13h30-16h55 Mercredi 08h00-12h15 -					
Horaire de travaii :	Jeudi 08h00-12h15 13h30-16h55	Ascension 18 mai				
	Vendredi	Pont de l'Ascension 19 mai				
Nombre d'heures :	90 heures					
Planning (en H ou %)	Analyse: 15h, Implémentation: 40h, Tests: 18h, Documentation: 17h					
Présentation :	Dates retenues : 12 ou 13 juin 2023					

5.6.2 Procédure

Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.

Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.

Le candidat a connaissance de la feuille d'appréciation avant de débuter le travail. Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.

En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.



Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

5.6.3 Titre

Création d'une application en C# d'archivage et de consultation de factures Manuel d'Installation

5.6.4 Matériel et logiciel à disposition

1 ordinateur en configuration standard CPNV avec accès à internet (Windows 10) Environnement de développement Microsoft Visual Studio Outil de modélisation de base de données Base de données Outil de gestion de versions tel git Liste non exhaustive pouvant dépendre des choix techniques effectués et de l'expérience du candidat

5.6.5 Prérequis

Compétences en développement C# Compétences en modélisation et gestion de base de données

5.6.6 Descriptif du projet

Le candidat devra dans un premier temps procéder à l'analyse et la conception des différents modules de l'application. Cette analyse comprendra la modélisation de la base de données ainsi qu'une maquette de l'application. Ensuite, il commencera la réalisation et effectuera les tests nécessaires.

L'application doit couvrir les cas suivants :

- Partie « administrateur » (avec authentification) :
 - Import manuel des factures :
 - L'administrateur, seul, par l'intermédiaire d'une interface graphique, pourra importer les images électroniques des factures et ajouter leurs données manuellement. Les données à entrer dans l'application sont les suivantes : nom du fournisseur (émetteur de la facture), destinataire, date, numéro de facture, type (médicale, communications, électricité, loyer...), devise, montant HT et montant TTC de la facture, lieu rangement papier. Les images électroniques des factures seront stockées dans un dossier Windows, le chemin vers ce dossier sera sauvegardé dans la base de données. Les fichiers des factures fournies seront tous au format PDF, leur taille ne devra pas être supérieure à 5 Mo.



- Mise à jour des données « fournisseur »
 Une interface graphique permettra d'insérer dans la base de données la liste des fournisseurs des factures. Cette information sera utilisée lors de l'import des données des factures et en facilitera l'usage.
- Partie « utilisateur » (avec authentification) :
 - Consultation des factures :
 - Un utilisateur pourra consulter les factures archivées dans le système. Une interface sera créée et permettra de rechercher, en fonction de critères, une ou plusieurs factures. Une liste contenant les données principales des factures correspondant aux critères de recherche s'affichera. L'utilisateur, en cliquant sur un élément de cette liste, aura la possibilité d'accéder à toutes les données de la facture en même temps qu'à l'image. Il devra pouvoir imprimer cette image. Le candidat définira lors de son analyse les données principales à afficher lors du résultat de sa recherche.
 - Statistiques
 - L'utilisateur aura accès à des statistiques sur l'ensemble des factures. Il pourra ainsi connaître le montant moyen dépensé par année et par fournisseur sur les 5 dernières années. La présentation de ces statistiques sera laissée au choix du candidat.

Le candidat sera libre de choisir sa méthode de gestion de projet ainsi que le système de gestion de base de données. Il devra justifier ses choix.

Le candidat devra écrire une classe de tests automatiques sur une classe au choix de son projet.

5.6.7 Livrables

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale sous forme électronique au format PDF le 02 mai 2022
- Un rapport de projet sous forme électronique au format PDF deux fois par semaine, le mardi soir et le jeudi soir
- Un journal de travail sous forme électronique au format PDF deux fois par semaine, le mardi soir et le jeudi soir
- A la fin du TPI, son rapport de projet final et son journal de travail sous forme électronique au format PDF
- A la fin du TPI, une archive contenant :
 - Un script de création de la base de données
 - o Un dossier contenant le code de l'application complète
 - Une procédure installation de l'application
 - Un exécutable de l'application



5.6.8 Points techniques évalués spécifiques au projet

La grille d'évaluation définit les critères généraux selon lesquels le travail du candidat sera évalué (documentation, journal de travail, respect des normes, qualité, ...).

En plus de cela, le travail sera évalué sur les 7 points spécifiques suivants (Point A14 à A20) :

- 1. Choix, modélisation et intégration de la base de données
- Qualité et lisibilité du code source, respect des conventions de nommage standards et du CPNV
- 3. Architecture du code source, séparation IHM et code métier
- 4. L'import réussi des factures (images et données)
- 5. La recherche réussie des factures selon les critères demandés
- 6. L'affichage réussi de la statistique concernant le montant moyen dépensé par année et fournisseur
- 7. La complétude de la classe de tests par rapport à la classe productive

5.7 Archives du projet

Dans une fourre plastique
